Work in Progress Srl
Corso di Porta Romana, 6
20122 Milano
t +39 02 78621700
www.wip.it

committente
EUROPA RISORSE SGR SpA
FONDO ANDROMEDA IN LIQUIDAZIONE

P.I.I. QUARTIERE STAZIONE

commessa	file			
14-20 PASE	PASE-FG2-T10-C.docx			
data emissione	revisione	redatto	controllato	approvato
18.05.2018	C	GM	EG	LV

VARIANTE

rev mag 2018

CRONOPROGRAMMA

cod. elaborato

FG2 T10

A NORMA DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI D'AUTORE IL PRESENTE DOCUMENTO NON PUÒ ESSERE RIPRODOTTO NÈ DIVULGATO A TERZI SENZA IL NOSTRO CONSENSO – TRIBUNALE COMPETENTE MILANO

ID	Nome attività
1	**VARIANTE P.I.I. QUARTIERE STAZIONE**
2	**Stipula atto integrativo alla Convenzione**
3	Approvazione Variante PII
4	Istruttoria e permuta delle aree
5	Stipula
6	**UNITA' DI INTERVENTO 1 - Stazione Bus e Verde pubblico**
7	**Area 9 - Sistemazione a verde**
8	Progetto
9	Presentazione Pratica al Comune
10	Istruttoria tecnica progetto
11	Rilascio titolo abilitativo
12	**Appalto**
15	Esecuzione opere U.I.1 - sistemazione a verde
16	Fine lavori
17	**Area 10 - Stazione Bus**
18	Progetto
19	Presentazione Pratica al Comune
20	Istruttoria tecnica progetto
21	Rilascio titolo abilitativo
22	**Appalto**
25	Esecuzione opere U.I.1 - piazza pubblica
26	Fine Lavori
27	Collaudo
28	**UNITA' DI INTERVENTO 5a - Pista Ciclabile**
29	Progetto
30	Presentazione pratica al Comune
31	Istruttoria tecnica progetto esecutivo
32	Rilascio titolo abilitativo
33	**Appalto**
36	Esecuzione opere U.I.5 - pista ciclabile
37	Fine Lavori
38	Collaudo
39	**UNITA' DI INTERVENTO 6 - Parco**
40	Progetto
41	Presentazione pratica al Comune
42	Istruttoria tecnica progetto esecutivo
43	Rilascio titolo abilitativo
44	**Appalto**
47	Esecuzione opere U.I.6 - parco
48	Fine Lavori
49	Collaudo
50	**UNITA' DI INTERVENTO 3 - Parcheggio a raso - Supermercato - Piazza pubblica**
51	Progetto
52	Presentazione pratica al Comune
53	Istruttoria tecnica progetto esecutivo
54	Rilascio titolo abilitativo
55	**Appalto**
58	Esecuzione opere U.I.3 - parcheggio a raso
59	Fine Lavori
60	Consegna provvisoria al Comune
61	Collaudo
62	Esecuzione opere U.I.3 - supermercato
63	Esecuzione opere U.I.3 - piazza
64	Fine Lavori
65	Collaudo
66	**UNITA' DI INTERVENTO 7 - Parcheggio**
67	Progetto
68	Presentazione pratica al Comune
69	Istruttoria tecnica progetto esecutivo
70	Rilascio titolo abilitativo
71	**Appalto**
74	Esecuzione opere U.I.7 - parcheggio
75	Fine Lavori
76	Collaudo
77	**UNITA' DI INTERVENTO 4 - Residenza e Parco/Piazza pubblica**
78	Progetto
79	Presentazione pratica al Comune
80	Istruttoria tecnica progetto esecutivo
81	Rilascio titolo abilitativo
82	**Appalto**
85	Esecuzione opere U.I.4 - Residenza
86	Fine lavori
87	Esecuzione opere U.I.4 - Parco/Piazza pubblica
88	Fine lavori
89	Collaudo opere a Parco/Piazza pubblica
90	**UNITA' DI INTERVENTO 5b - Parco**
91	Progetto
92	Presentazione pratica al Comune
93	Istruttoria tecnica progetto esecutivo
94	Rilascio titolo abilitativo
95	**Appalto**
98	Esecuzione opere U.I.5b - Parco
99	Fine Lavori
100	Collaudo
101	**UNITA' DI INTERVENTO 2 - Asilo o struttura polivalente, Parcheggio, Edilizia libera comunale**
102	Progetto
103	Presentazione pratica al Comune
104	Istruttoria tecnica progetto esecutivo
105	Rilascio titolo abilitativo
106	**Appalto**
109	Esecuzione opere U.I.2 - asilo o funzione similare ed edilizia comunale
110	Fine Lavori
111	Collaudo opere edilizia comunale
112	Esecuzione opere U.I.2 - Parcheggio
113	Fine Lavori
114	Collaudo opere parcheggio

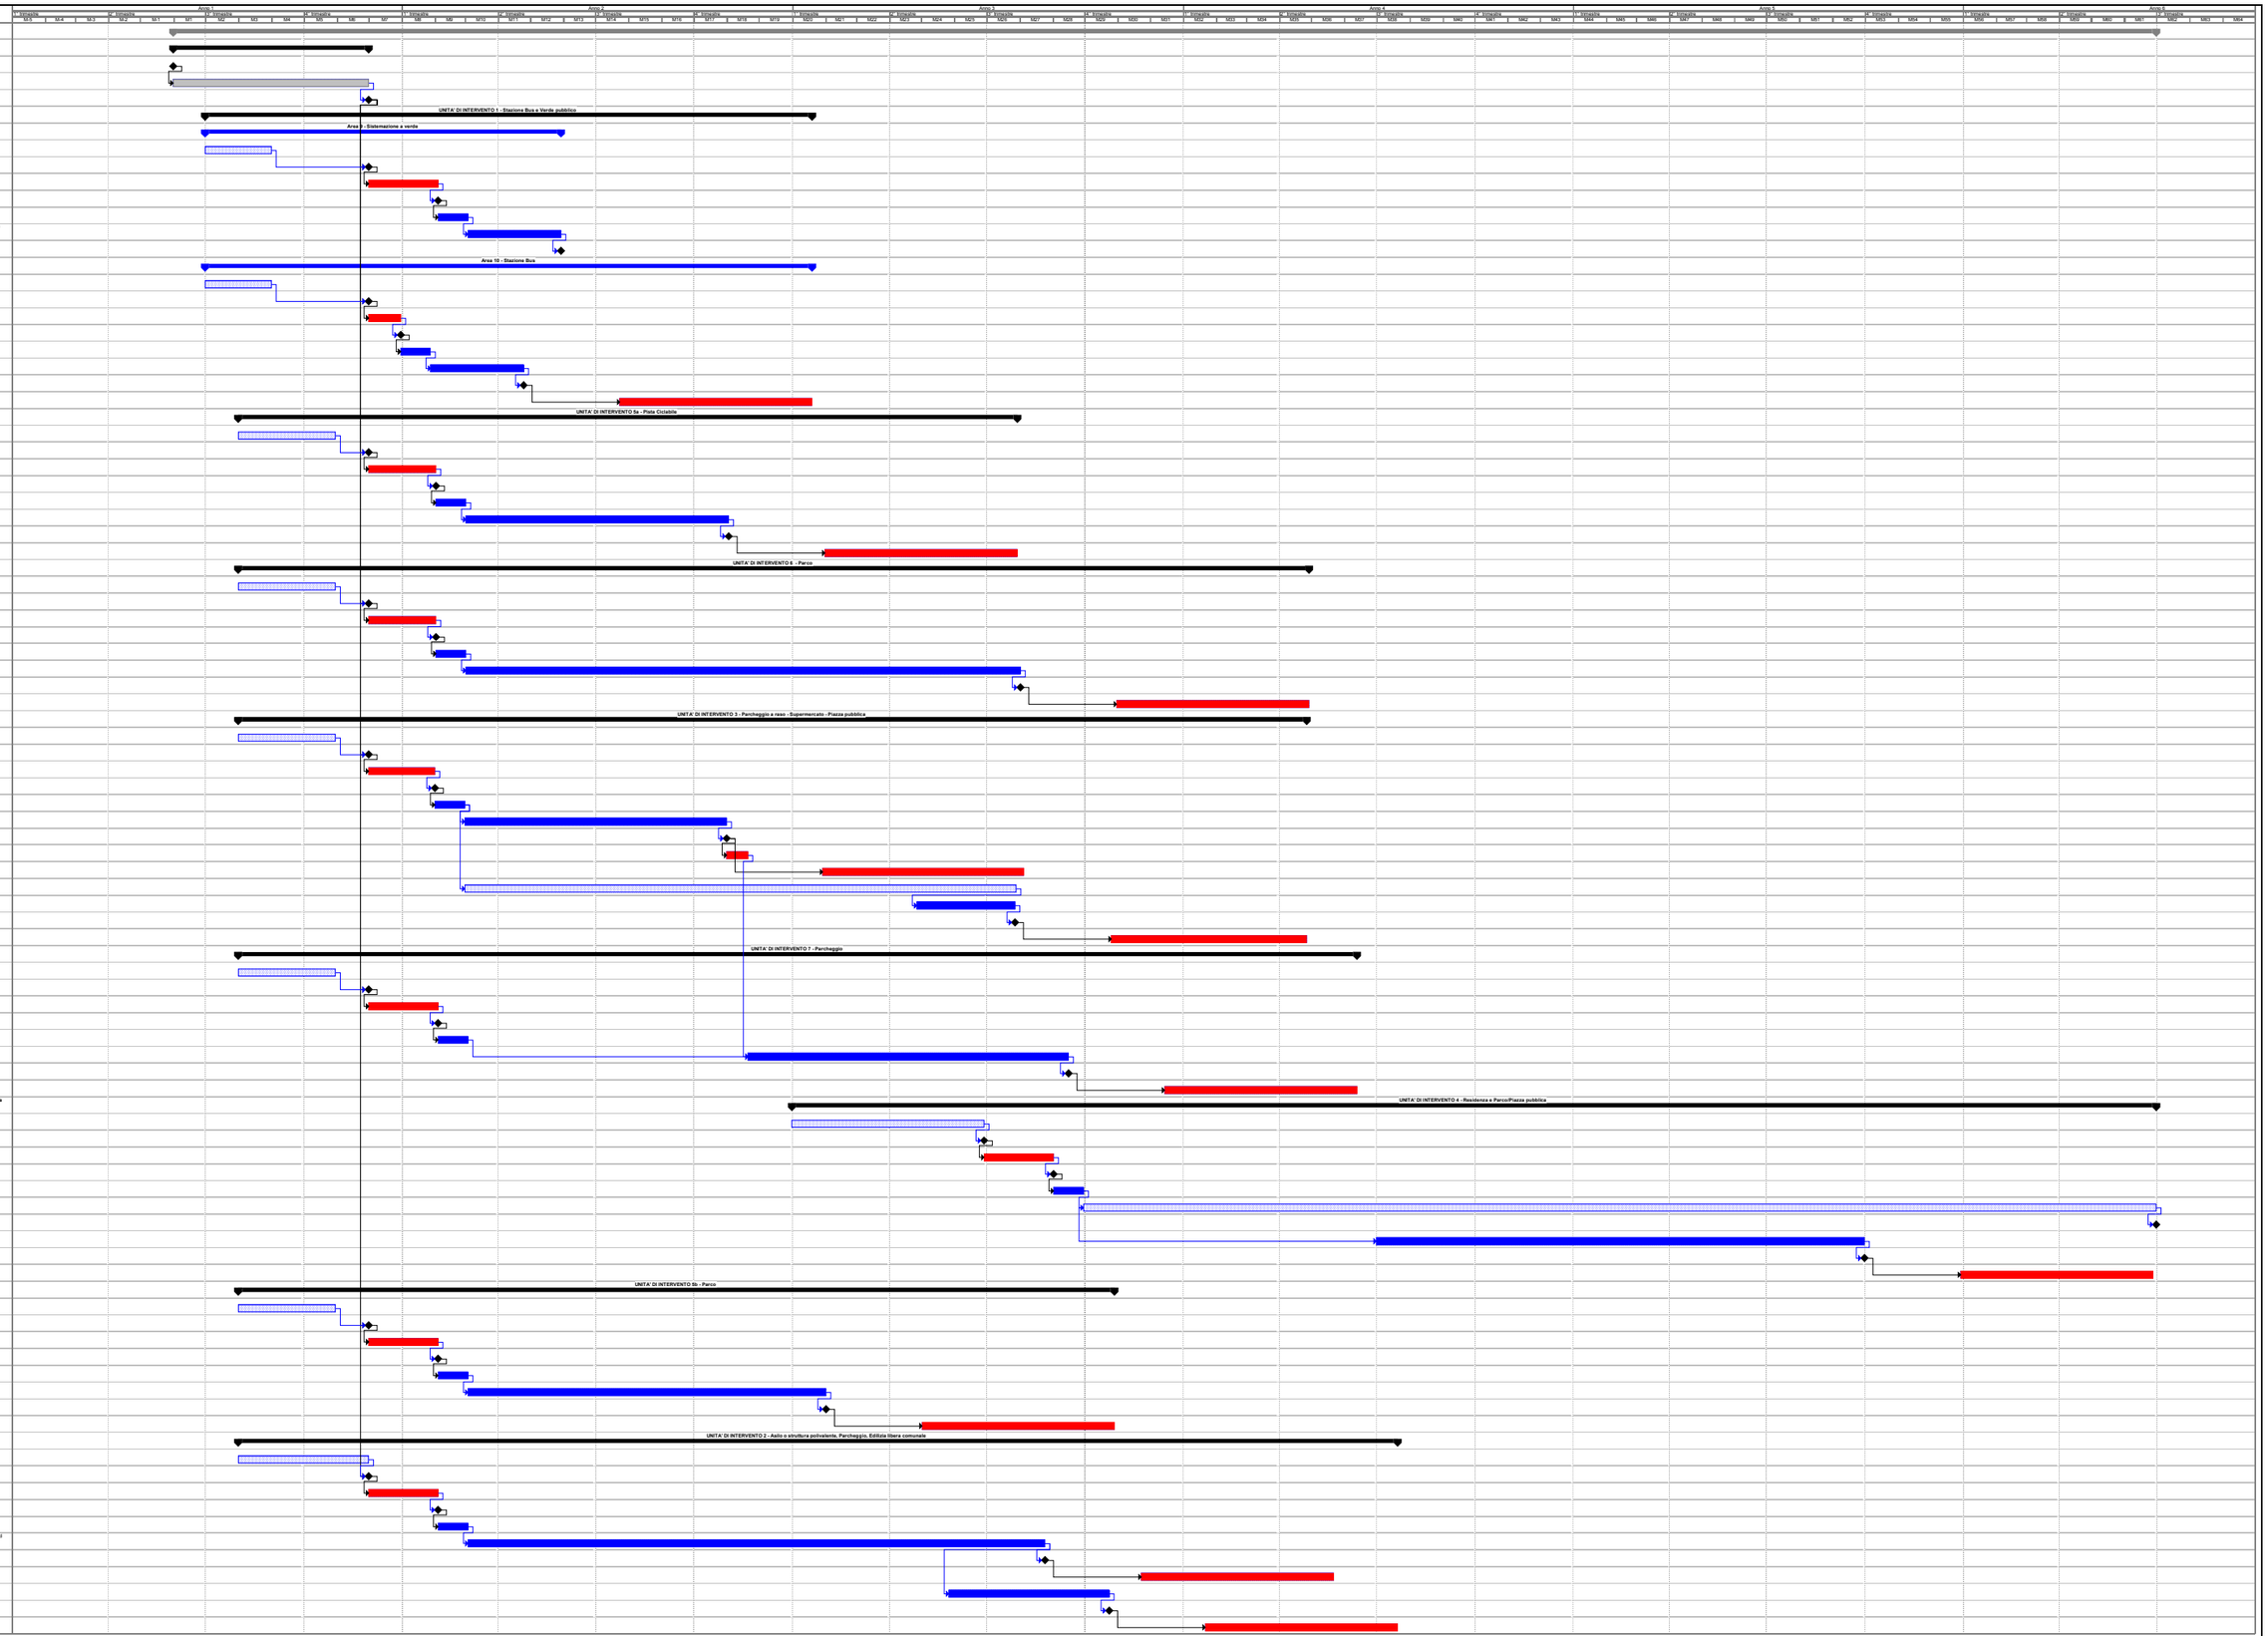

Progetto: PASE-FO2-T10-C
Data: 18.05.2018

Azioni Soggetto Attuatore | Azioni Soggetto Attuatore | Azioni Comune | Cardine | Riepilogo | Riepilogo progetto
